

PROJECT CHARTER

MATAKULIAH PROYEK PERANGKAT LUNAK

Nama Proyek : Sistem e-Katalog dan Manajemen Pesanan Cute Dimsum	Nomor Proyek: Kelompok 4
Tanggal: 28/03/2026	Revisi terakhir: -
Manajer Proyek: D1A240054 - Devi Lestari	Tanggal mulai proyek: 04/03/2026
Staff Proyek: 1. D1A240060 – Kaysa Nabila Firdausy 2. D1A240066 - Faisal Mahfuzh Afrizal 3. D1A240069 - Yudha Adi Nugraha 4. D1A240089 - Habibah Ratu Aqilah	Tanggal selesai proyek: 12/06/2026
Kelas: 4 Reguler C	

**SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SUBANG
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
Deskripsi dan Tujuan Proyek	2
Ruang Lingkup Proyek	2
Asumsi, Batasan, dan Risiko Proyek.....	3
Struktur Organisasi Proyek.....	3
Project Milestone	4
Rencana Anggaran Belanja (RAB) Proyek	4
Manajemen Komunikasi	6
Persetujuan Proyek.....	7
LAMPIRAN A WORK BREAKDOWN STRUCTURE.....	8
LAMPIRAN B JADWAL PROYEK.....	10
LAMPIRAN C DIAGRAM NETWORK.....	12

Deskripsi dan Tujuan Proyek

- **Latar Belakang Masalah:** Saat ini, proses pemesanan dan pencatatan menu di Cute Dimsum masih dilakukan secara manual atau terpisah dari sistem kasir. Katalog menu yang tidak terpusat menyebabkan pelanggan kesulitan melihat ketersediaan menu secara *real-time*, dan pihak manajemen kesulitan dalam memantau statistik pesanan secara akurat.
- **Kebutuhan Bisnis:** Cute Dimsum membutuhkan sebuah platform digital berbasis web yang dapat menampilkan katalog menu bagi pelanggan dan memiliki dasbor belakang (Admin Dashboard) untuk memonitor pesanan, mengatur ketersediaan menu, dan melihat metrik pendapatan secara terpusat.
- **Tujuan Proyek:** Membangun aplikasi web pemesanan dan manajemen menu *Full-Stack* menggunakan framework Laravel (sebagai RESTful API backend) dan Vue.js (sebagai Frontend antarmuka interaktif) untuk meningkatkan efisiensi operasional harian kasir/admin minimal sebesar 40% dan mempermudah pelanggan dalam melihat katalog produk eksklusif Cute Dimsum secara daring.

Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup proyek ini berfokus pada pengembangan fitur inti Sistem Manajemen Pemesanan, yaitu:

1. **Modul Autentikasi Admin:** Sistem login menggunakan Laravel Sanctum Token untuk mengamankan Dasbor Admin.
2. **Dasbor Metrik (Admin):** Menampilkan ringkasan pesanan *pending*, total menu aktif, total pesanan, dan estimasi pendapatan harian/bulanan.
3. **Manajemen Menu (CRUD):** Fungsionalitas bagi Admin untuk Menambah, Mengedit, Membaca, dan Menghapus atau mengatur status ketersediaan (Habis/Tersedia) menu dimsum, lengkap dengan foto, harga, serta kategori produk.
4. **Halaman Katalog Pelanggan:** Halaman responsif bagi pelanggan (tanpa perlu login profil) untuk melihat ketersediaan varian menu secara visual.
5. **Modul Manajemen Pesanan:** Antarmuka bagi Admin untuk menerima, melacak, dan merubah status pesanan (*Pending, Processing, Completed*).

Di luar Ruang Lingkup (Out of Scope): Solusi pembayaran digital / *Payment Gateway* otomatis (pembayaran dianggap kasir/transfer manual dan dikonfirmasi admin), Integrasi aplikasi ekspedisi pelacakan ojek *online*.

Asumsi, Batasan, dan Risiko Proyek

1.1 Asumsi Proyek

- Server infrastruktur yang digunakan memiliki dukungan standar minimum PHP 8.4 dan Node.js 20+.
- Klien (Cute Dimsum) akan menyediakan materi promosi visual (gambar menu, logo) dengan resolusi yang memadai.
- Pelanggan mayoritas mengakses dari gawai smartphone sehingga orientasi desain ditujukan pada Mobile-First Design.

1.2 Batasan Proyek

- Pengembangan aplikasi dibatasi untuk 1 (satu) entitas cabang/toko Cute Dimsum dan belum mendukung arsitektur multi-branch/banyak cabang.
- Tidak mempertimbangkan pajak/Ppn yang kompleks dalam kalkulasi harga invoice ke pelanggan.
- Waktu penyelesaian keseluruhan proyek dibatasi maksimal selama 3 minggu jam kerja dari tanggal dimulainya proyek.

1.3 Risiko Proyek

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1	Keterlambatan pengumpulan aset gambar menu oleh pihak klien yang menahan proses <i>Quality Assurance</i>	Memasukkan gambar/menu sementara (dummy data) melalui fitur <i>Seeder Database</i> untuk melanjutkan iterasi komponen UI.
2	Kegagalan sinkronisasi CORS (<i>Cross-Origin</i>) antara API Laravel dan Domain Vue.js saat proyek <i>Go-Live</i>	Mengkonfigurasi parameter config/cors.php di sisi web resminya secara ketat dengan mendaftarkan proksi <i>frontend_domain</i> spesifik sejak fase beta.
3	Anggaran <i>hosting</i> bulanan klien tidak mencukupi memori untuk instalasi dua repositori (Backend & Frontend) di <i>Virtual Private Server</i> (VPS).	Menggunakan solusi optimasi <i>Vite build/dist</i> yang diekspor menjadi laman HTML statis dan diletakkan dalam direktori <i>/public</i> Laravel sehingga mengurangi beban memori di satu server/berbagi <i>resource</i> .

Struktur Organisasi Proyek

Jabatan/ Peranan	Nama	Tanggung Jawab
Manajer Proyek	Devi Lestari	Memantau seluruh progres, mengatur ritme jadwal harian, serta penghubung utama dengan <i>Stakeholder</i> klien (Owner Cute Dimsum).

Jabatan/ Peranan	Nama	Tanggung Jawab
System Analyst	Habibah Ratu Aqilah	Menganalisis kebutuhan aliran basis data relasional (<i>schema mapping</i>) menu dan pemesanan.
System Design	Kaysa Nabila Firdausy	Mendesain hirarki antarmuka UI/UX di Figma dan pemilihan <i>Tailwind CSS</i> .
Programmer	Faisal Mahfuzh Afrizal	Mengeksekusi pembangunan REST API (Laravel 12) dan penyusunan komponen Frontend (Vue 3, Vue Router).
System Testing	Yudha Adi Nugraha	Melakukan uji ketahanan proses <i>Check-out</i> pemesanan pelanggan ke basis data.
System Documentation	Semua Tim	Membuat ringkasan <i>End-user manual</i> bagaimana <i>Owner Cute Dimsum</i> login dan menambah menu.

Project Milestone

No.	Project Milestone	Target selesai (dd/mm/yyyy)
1.	Project Start	04/03/2026
2.	Complete Analyst	22/04/2026
3.	Complete Design	13/05/2026
4.	Complete simulation with software	20/05/2026
5.	Complete simulation and testing	27/05/2026
6.	Complete installation software	03/06/2026
7.	Project Complete	12/06/2026

Rencana Anggaran Belanja (RAB) Proyek

No.	Aktivitas Proyek	Durasi (hari)	Jumlah tenaga kerja	Tarif tenaga kerja	Biaya tenaga kerja	Total biaya
1	TAHAP INISIASI & PERENCANAAN					
1.1	Survey Lokasi & Penentuan Objek	3	5	Rp40.000	Rp600.000	Rp1.300.000
1.2	Penyusunan Proposal	6	1	Rp50.000	Rp350.000	
1.3	Timeline ClickUp	3	1	Rp50.000	Rp150.000	
1.4	Project Charter	4	1	Rp50.000	Rp200.000	
2	TAHAP ANALISIS					
2.1	Observasi & Wawancara	2	5	Rp45.000	Rp450.000	Rp1.375.000

No.	Aktivitas Proyek	Durasi (hari)	Jumlah tenaga kerja	Tarif tenaga kerja	Biaya tenaga kerja	Total biaya
2.2	Identifikasi Kebutuhan Fungsional	4	1	Rp50.000	Rp200.000	
2.3	Identifikasi Non-Functional Req.	3	1	Rp50.000	Rp150.000	
2.4	Penyusunan Dokumen SRS Final	7	1	Rp50.000	Rp350.000	
3	TAHAP PEMODELAN UML					
3.1	Pembuatan Use Case & Activity	3	1	Rp55.000	Rp165.000	Rp385.000
3.2	Pembuatan Sequence & Class	4	1	Rp55.000	Rp220.000	
4	TAHAP DESAIN SISTEM					
4.1	Perancangan Database & ERD	7	1	Rp65.000	Rp455.000	Rp840.000
4.2	Desain Wireframe & UI/UX (Figma)	7	1	Rp55.000	Rp385.000	
5	TAHAP IMPLEMENTASI & CODING					
5.1	Backend Development & API Integration	14	1	Rp95.000	Rp1.330.000	Rp2.590.000
5.2	Frontend Development & Web Katalog	14	1	Rp90.000	Rp1.260.000	
6	TAHAP TESTING & QA					
6.1	Pelaksanaan Blackbox Testing	4	1	Rp50.000	Rp200.000	Rp350.000
6.2	Perbaikan Bug & UAT	3	1	Rp50.000	Rp150.000	
7	INFRASTRUKTUR & CLOSING					
7.1	Sewa Hosting VPS & Domain .id (1 Thn)	-	-	-	-	Rp1.100.000
7.2	Pembuatan QR Code & Prototype QR Stand Meja	-	-	-	-	Rp250.000
7.3	Penyusunan Laporan Akhir (Full Team)	5	5	Rp50.000	Rp1.250.000	Rp3.100.000
7.4	Presentasi Final Proyek (Full Team)	2	5	Rp50.000	Rp500.000	
	Jumlah total biaya proyek	Rp9.940.000				
	Harga proyek	Rp12.500.000				
	Keuntungan Proyek	Rp2.560.000				

Manajemen Komunikasi

Jenis pertemuan	Agenda	Waktu	Penanggung jawab	Partisipan	Masukan	Keluaran
Pertemuan awal tim	Pembentukan tim, pembagian peran, dan penentuan topik proyek	Pertemuan 1 (Minggu ke-1) 4 Maret 2026	Devi Lestari	Seluruh anggota kelompok	Arahan mata kuliah, ide awal proyek	Topik proyek dan pembagian peran tim
Diskusi metodologi dan penyusunan proposal dan timeline gantt chart	Membahas metodologi pengembangan perangkat lunak yang sesuai serta menyusun proposal proyek	Pertemuan 2 (Minggu ke-2) 11 Maret 2026	Devi Lestari	Seluruh anggota kelompok	Referensi metodologi, karakteristik proyek, template proposal	Draft proposal proyek+clickUp timeline
Rapat penyusunan Project Charter	Menyusun dokumen inisiasi proyek yang memuat ruang lingkup, tujuan, metodologi, dan pembagian tugas tim	Pertemuan 3 (Minggu ke-3) 25 Maret 2026	Devi Lestari	Seluruh anggota kelompok	Proposal proyek, pembagian peran tim	Dokumen Project Charter
Pertemuan observasi dan wawancara	Mengumpulkan informasi dari pihak Cute Dimsum terkait proses pemesanan yang sedang berjalan	Pertemuan 4 (Minggu ke-4)	Habibah Ratu Aqilah	Seluruh anggota kelompok / pihak Cute Dimsum	Hasil observasi dan wawancara	Data awal kebutuhan sistem
Rapat analisis kebutuhan	Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem	Pertemuan 5 (Minggu ke-5)	Habibah Ratu Aqilah	Seluruh anggota kelompok	Hasil observasi, wawancara, catatan kebutuhan	Daftar kebutuhan sistem
Rapat pemodelan sistem	Menyusun Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram	Pertemuan 6 (Minggu ke-6)	Habibah Ratu Aqilah	Seluruh anggota kelompok	Hasil analisis kebutuhan	Dokumen pemodelan UML
Rapat penyusunan SRS	Menyusun dokumen Software Requirements Specification (SRS) berdasarkan hasil analisis kebutuhan	Pertemuan 7 (Minggu ke-7)	Habibah Ratu Aqilah	Seluruh anggota kelompok	Daftar kebutuhan sistem, hasil analisis	Dokumen SRS

Jenis pertemuan	Agenda	Waktu	Penanggung jawab	Partisipan	Masukan	Keluaran
Evaluasi Tengah Semester	Evaluasi progres proyek dan capaian pengerjaan sampai pertengahan semester	Pertemuan 8 (Minggu ke-8)	Devi Lestari	Seluruh anggota kelompok	Proposal, charter, analisis, UML, SRS	Evaluasi progres proyek
Rapat desain sistem	Membahas arsitektur sistem, database, ERD, dan rancangan struktur sistem	Pertemuan 9 (Minggu ke-9)	Habibah Ratu Aqilah	Seluruh anggota kelompok	Dokumen SRS, UML	Dokumen desain sistem
Rapat desain antarmuka	Menyusun wireframe dan prototype antarmuka sistem menggunakan Figma	Pertemuan 10 (Minggu ke-10)	Kaysa Nabila Firdausy	Seluruh anggota kelompok	Dokumen desain sistem, kebutuhan pengguna	Wireframe dan prototype UI/UX
Koordinasi implementasi sistem	Membahas progres coding backend dan frontend serta integrasi modul sistem	Pertemuan 11 (Minggu ke-11)	Faisal Mahfuzh Afrizal	Faisal, anggota terkait	Dokumen desain sistem, prototype UI/UX	Progres implementasi sistem
Rapat pengujian sistem	Menyusun test case dan membahas hasil pengujian sistem	Pertemuan 12 (Minggu ke-12)	Yudha Adi Nugraha	Yudha, Faisal, pihak terkait	Sistem yang telah dibangun	Laporan hasil pengujian dan bug report

Persetujuan Proyek

Disetujui oleh: Pihak Cute Dimsum	Tanggal:
Disetujui oleh: Dosen Pengampu	Tanggal:
Disetujui oleh: Project Manager	Tanggal:

LAMPIRAN A WORK BREAKDOWN STRUCTURE

LAMPIRAN B JADWAL PROYEK

LAMPIRAN C DIAGRAM NETWORK

LAMPIRAN A
WORK BREAKDOWN STRUCTURE

Nama Proyek : Sistem e-Katalog dan Manajemen Pesanan
Cute Dimsum

Tanggal Mulai Proyek : 04/03/2026

Tanggal Selesai Proyek: 12/06/2026

No.	Aktivitas Proyek
1	Inisiasi Proyek
1.1	Identifikasi Masalah Operasional pada Cute Dimsum
1.2	Penentuan Studi Kasus dan Batasan Solusi Digital
2	Perencanaan Proyek
2.1	Penyusunan Proposal Proyek Perangkat Lunak
2.2	Penyusunan Jadwal Proyek (<i>Gantt Chart</i>)
2.3	Penyusunan <i>Project Charter</i>
3	Analisis Kebutuhan
3.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Observasi/Wawancara Pengguna
3.2	Analisis Proses Bisnis Manual pada Cute Dimsum
3.3	Analisis Kebutuhan Sistem Backend dan Frontend
3.4	Penyusunan Kebutuhan Fungsional
3.5	Penyusunan Kebutuhan Non-Fungsional
3.6	Penyusunan Dokumen <i>Software Requirements Specification</i> (SRS)
4	Pemodelan Sistem
4.1	Pembuatan <i>Use Case Diagram</i> dan <i>Activity Diagram</i>
4.2	Perancangan <i>Robustness Diagram</i> , <i>Sequence Diagram</i> , dan <i>Class Diagram</i>
4.3	Perancangan <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD)
5	Desain Sistem
5.1	Desain Arsitektur Sistem Berbasis REST API
5.2	Perancangan Database dan Struktur Relasi Data
5.3	Desain UI/UX (<i>High-Fidelity</i>) menggunakan Figma
6	Implementasi Sistem
6.1	Pengembangan Backend
6.2	Pengembangan Frontend

No.	Aktivitas Proyek
6.3	Integrasi Basis Data, API, dan Sinkronisasi CORS
7	Pengujian Sistem
7.1	Penyusunan <i>Test Case</i> Pengujian Sistem
7.2	Pelaksanaan <i>Blackbox Testing</i>
7.3	Pelaksanaan <i>User Acceptance Testing</i> (UAT)
7.4	Perbaikan Bug dan Evaluasi Hasil Pengujian
8	Dokumentasi dan Penutupan Proyek
8.1	Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Proyek
8.2	Pembuatan <i>End-User Manual</i> untuk Owner Cute Dimsum
8.3	Persiapan Presentasi Akhir Proyek
8.4	Presentasi dan Finalisasi Proyek

LAMPIRAN B

JADWAL PROYEK

Nama Proyek : Sistem e-Katalog dan Manajemen Pesanan
Cute Dimsum

Tanggal Mulai Proyek : 04/03/2026

Tanggal Selesai Proyek: 12/06/2026

No.	Aktivitas Proyek	Durasi (Hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Aktivitas Pendahulu (Predecessor)
1	Inisiasi Proyek	7	25/02/2026	03/03/2026	-
1.1	Identifikasi Masalah Operasional pada Cute Dimsum	3	25/02/2026	27/02/2026	-
1.2	Penentuan Studi Kasus dan Batasan Solusi Digital	4	28/02/2026	03/03/2026	1.1
2	Perencanaan Proyek	15	25/02/2026	11/03/2026	1
2.1	Penyusunan Proposal Proyek Perangkat Lunak	15	25/02/2026	11/03/2026	1.2
2.2	Penyusunan Jadwal Proyek (Gantt Chart)	4	08/03/2026	11/03/2026	2.1
2.3	Penyusunan Project Charter	8	25/03/2026	01/04/2026	2.2
3	Analisis Kebutuhan	21	02/04/2026	22/04/2026	2.3
3.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Observasi/Wawancara Pengguna	4	02/04/2026	05/04/2026	2.3
3.2	Analisis Proses Bisnis Manual pada Cute Dimsum	3	06/04/2026	08/04/2026	3.1
3.3	Analisis Kebutuhan Sistem Backend dan Frontend	3	09/04/2026	11/04/2026	3.2
3.4	Penyusunan Kebutuhan Fungsional	3	12/04/2026	14/04/2026	3.3
3.5	Penyusunan Kebutuhan Non-Fungsional	3	15/04/2026	17/04/2026	3.4
3.6	Penyusunan Dokumen Software Requirements Specification (SRS)	5	18/04/2026	22/04/2026	3.5
4	Pemodelan Sistem	10	23/04/2026	02/05/2026	3
4.1	Pembuatan Use Case Diagram dan Activity Diagram	3	23/04/2026	25/04/2026	3.6
4.2	Perancangan Robustness Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram	4	26/04/2026	29/04/2026	4.1

No.	Aktivitas Proyek	Durasi (Hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Aktivitas Pendahulu (Predecessor)
4.3	Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD)	3	30/04/2026	02/05/2026	4.2
5	Desain Sistem	11	03/05/2026	13/05/2026	4
5.1	Desain Arsitektur Sistem Berbasis REST API	3	03/05/2026	05/05/2026	4.3
5.2	Perancangan Database dan Struktur Relasi Data	3	06/05/2026	08/05/2026	5.1
5.3	Desain UI/UX (High-Fidelity) menggunakan Figma	5	09/05/2026	13/05/2026	5.2
6	Implementasi Sistem	7	14/05/2026	20/05/2026	5
6.1	Pengembangan Backend	2	14/05/2026	15/05/2026	5.3
6.2	Pengembangan Frontend	2	16/05/2026	17/05/2026	6.1
6.3	Integrasi Basis Data, API, dan Sinkronisasi CORS	3	18/05/2026	20/05/2026	6.2
7	Pengujian Sistem	7	21/05/2026	27/05/2026	6
7.1	Penyusunan Test Case Pengujian Sistem	2	21/05/2026	22/05/2026	6.3
7.2	Pelaksanaan Blackbox Testing	2	23/05/2026	24/05/2026	7.1
7.3	Pelaksanaan User Acceptance Testing (UAT)	2	25/05/2026	26/05/2026	7.2
7.4	Perbaikan Bug dan Evaluasi Hasil Pengujian	1	27/05/2026	27/05/2026	7.3
8	Dokumentasi dan Penutupan Proyek	16	28/05/2026	12/06/2026	7
8.1	Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Proyek	6	28/05/2026	02/06/2026	7.4
8.2	Pembuatan End-User Manual untuk Owner Cute Dimsum	1	03/06/2026	03/06/2026	8.1
8.3	Persiapan Presentasi Akhir Proyek	4	04/06/2026	07/06/2026	8.2
8.4	Presentasi dan Finalisasi Proyek	5	08/06/2026	12/06/2026	8.3

LAMPIRAN C

DIAGRAM NETWORK

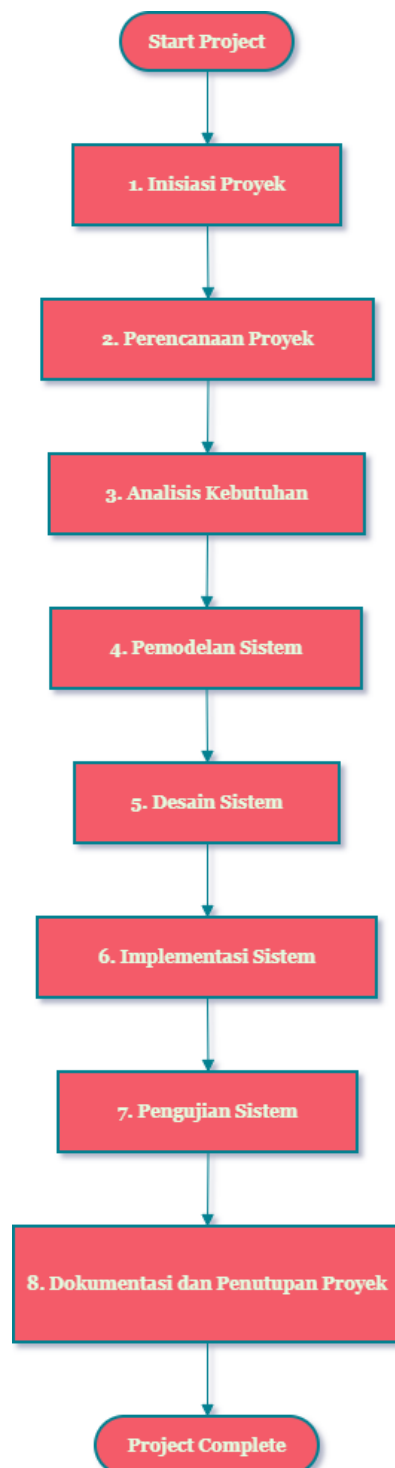


Figure 1 Diagram Network
